

Factuur



Combinatie STIPT

AFZENDER

Combinatie STIPT, Postbus 470, 2130 AL HOOFDORP

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Postbus 8185
3503 RD UTRECHT



DATUM

13-06-2020

DEBITEURCODE

RWS-UTR2

BLADNUMMER

1/1

FACTUURNUMMER

4810010

BTW-NUMMER OPDRACHTGEVER

NL821699180B01

EMAILADRES OPDRACHTGEVER

efacturen@rws.nl

POSTADRES

POSTBUS 470
2130 AL HOOFDORP

BEZOEKADRES

Marten Meesweg 25-G
ROTTERDAM

BETREFT

Zaaknummer: 31129973

Projectomschrijving: Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

PROJECTNUMMER

C481-10 -0000

BEHANDELD DOOR

AFDELING ADMINISTRATIE
T 023 - 752 86 22
E-MAIL

VERKOOPFACTUREN.DVI@
DURAVERMEER.NL

Omschrijving

Aantal

Eenh.

Prijs

Bedrag

Bestelnummer: 4500287593 - Positie 20

1,00 post

1.671.838,00

1.671.838,00

Totaal excl. BTW

1.671.838,00

BTW 21%

351.085,98

Totaalbedrag in €

2.022.923,98

BETALINGSGEGEVENS

ING NL80 INGB0654 3095 58

KvK 76263851

Btw NL860566687B01

BIC INGBNL2A

G-REKENING

Betalingsconditie: netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij betaling en op correspondentie debiteurcode en factuurnummer vermelden.

Model Prestatieverklaring UAV-GC

(Versie: 24-7-2017)

Naam Opdrachtnemer: Combinatie STIPT V.O.F.

Zaaknummer: 31129973

Prijs, excl. BTW: € 36.092.593 EURO¹

Aantal termijnen op basis van de
bij de Overeenkomst behorende
termijnstaat: 35 termijnen

Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Bram van Bemmelen

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de 12^e factureringstermijn, zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot €1.671.838 EURO² (zegge: één miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend achthonderdachtendertig EURO)³

.Bodegraven.....(plaats), 17-6-2020..... (datum)

......(handtekening)

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

Op de factuur dienen de volgende bedragen (excl. BTW) met bijbehorende bestelnummers gefactureerd te worden:


Bestelnummer: 4500287593, positienummer 20 Bedrag: € 1.671.838,00

¹ Bedrag in cijfers.


² Bedrag van de termijn in cijfers.

³ Bedrag van de termijn in letters

Termijnstaat - Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

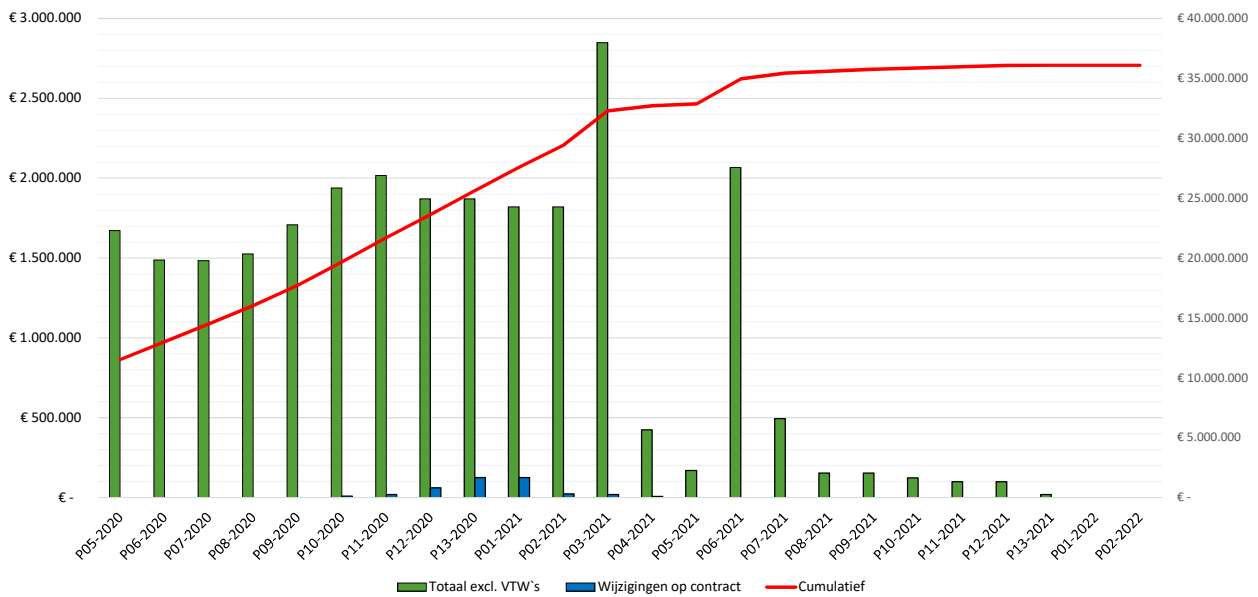

Termijn 12 - Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

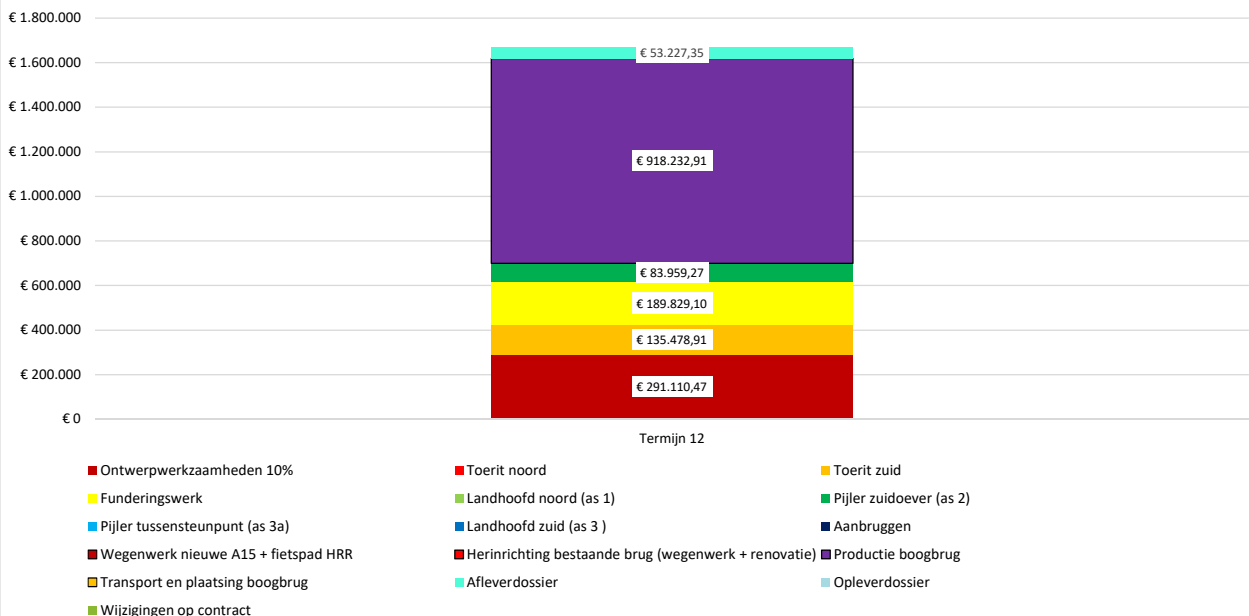

- Ontwerpwerkzaamheden 10%
- Funderingswerk
- Pijler tussensteunpunt (as 3a)
- Wegenwerk nieuwe A15 + fietspad HRR
- Transport en plaatsing boogbrug
- Wijzigingen op contract
- Toerit noord
- Landhoofd noord (as 1)
- Landhoofd zuid (as 3)
- Herinrichting bestaande brug (wegenwerk + renovatie)
- Afleverdossier
- Toerit zuid
- Pijler zuidoever (as 2)
- Aanbruggen
- Productie boogbrug
- Opleverdossier

Betaalpost	Omschrijving		Kostprijs	Aanneemsom	Controle	P05-2020 Termijn 12	P06-2020 Termijn 13	P07-2020 Termijn 14	P08-2020 Termijn 15	P09-2020 Termijn 16
1	Ontwerpwerkzaamheden 10%		10% € 2.588.665,32	€ 3.576.500,00	€ 3.576.500	€ 291.110	€ 83.174	€ -	€ -	€ -
2	Toerit noord		€ 761.955,00	€ 1.052.717,03	€ 1.052.717	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 79.539
3	Toerit zuid		€ 1.285.279,00	€ 1.775.741,47	€ 1.775.741	€ 135.479	€ 135.479	€ 135.479	€ 135.479	€ 135.479
4	Funderingswerk		€ 1.089.370,00	€ 1.505.073,59	€ 1.505.074	€ 189.829	€ 189.829	€ 189.829	€ 189.829	€ 189.829
5	Landhoofd noord (as 1)		€ 223.914,00	€ 309.359,58	€ 309.360	€ -	€ -	€ 30.500	€ 30.500	€ 30.500
6	Pijler zuidoever (as 2)		€ 551.267,00	€ 761.630,49	€ 761.630	€ 83.959	€ 83.959	€ 83.959	€ 83.959	€ 83.959
7	Pijler tussensteunpunt (as 3a)		€ 124.205,00	€ 171.601,63	€ 171.602	€ -	€ -	€ 11.314	€ 52.801	€ 52.801
8	Landhoofd zuid (as 3)		€ 168.980,00	€ 233.462,77	€ 233.463	€ -	€ 24.227	€ 61.669	€ 61.669	€ 61.669
9	Aanbruggen		€ 974.734,00	€ 1.346.692,49	€ 1.346.692	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102.466
10	Wegenwerk nieuwe A15 + fietspad HRR		€ 280.406,00	€ 387.408,93	€ 387.409	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11	Herinrichting bestaande brug (wegenwerk + renovatie)		€ 1.633.568,00	€ 2.256.937,55	€ 2.256.938	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	Productie boogbrug		€ 12.142.834,70	€ 16.776.540,42	€ 16.776.540	€ 918.233	€ 918.233	€ 918.233	€ 918.233	€ 918.233
13	Transport en plaatsing boogbrug		€ 1.181.712,71	€ 1.632.654,28	€ 1.632.654	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Afbouw		€ 1.523.545,00	€ 2.104.929,77	€ 2.104.930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal			€ 24.530.435,73	€ 33.891.250,00	€ 33.891.250	€ 1.618.611	€ 1.434.902	€ 1.430.984	€ 1.472.470	€ 1.654.475
14	Afleverdossier		3% € 1.070.250,00	€ 1.070.250,00	€ 1.070.250	€ 53.227	€ 53.227	€ 53.227	€ 53.227	€ 53.227
15	Opleverdossier		2% € 713.500,00	€ 713.500,00	€ 713.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal excl. VTW's			€ 26.314.185,73	€ 35.675.000,00	€ 35.675.000	€ 1.671.838	€ 1.488.129	€ 1.484.212	€ 1.525.698	€ 1.707.702
Cumulatief				€ 35.675.000,00	€ 35.675.000	€ 11.485.713	€ 12.973.843	€ 14.458.054	€ 15.983.752	€ 17.691.454
VTW	Wijzigingen op contract	Opdrachtbrief	€ 313.038	€ 417.593	€ 417.593	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Afwerking gewapende Grond		€ 190.220	€ 253.754	€ 253.754	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Leuningwerk hoger uitvoeren i.v.m. veiligheid	SHB-000785	€ 98.907	€ 131.942	€ 131.942	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Onderhoudswerk tijdens uitvoering		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Gewapende grond in CC3 uitvoeren ipv CC2		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Extra Bouwborden	SHB-000518	€ 3.010	€ 4.015	€ 4.015	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8	Tegenvallende geotechnische gesteldheid		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Dikkere dekplaat boogbrug		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Latere afvoer stamhout	SHB-000541	€ 2.890	€ 3.855	€ 3.855	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11	Bijlage N bij VSP		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	Gewijzigde rekenmethode aanvaarbeveiliging	SHB-000542	€ 18.011	€ 24.027	€ 24.027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Blauw toplicht OV masten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15	Doortrekken Geluidsscherm		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17	Wet arbeidsmarkt in balans		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	Verplaatsen kast nabij VDC		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Compendium beginpunt geleiderailconstructies		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Impact toetsing GPO op ontwerp/uitvoering Staal		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Impact werkzaamheden ProRail op monitoring		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
23	VVA-2 aanvullende vragen omtrent geleiderail		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
24	Verschil Tender en werkelijkse situatie t.b.v. HRL		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incl. VTW's			€ 26.627.224	€ 36.092.593	€ 36.092.593	€ 1.671.838	€ 1.488.129	€ 1.484.212	€ 1.525.698	€ 1.707.702
Cumulatief				€ 36.092.593	€ 36.092.593	€ 11.517.610	€ 13.005.740	€ 14.489.951	€ 16.015.649	€ 17.723.351

[illegible]

[illegible]
