

# Factuur



## AFZENDER

Combinatie STIPT, Postbus 470, 2130 AL HOOFFDORP

Combinatie STIPT

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Postbus 8185  
3503 RD UTRECHT



## DATUM

29-11-2020

## DEBITEURCODE

RWS-UTR2

## BLADNUMMER

1/1

## FACTUURNUMMER

4810016

## BTW-NUMMER OPDRACHTGEVER

NL821699180B01

## EMAILADRES OPDRACHTGEVER

efacturen@rws.nl

## POSTADRES

POSTBUS 470  
2130 AL HOOFFDORP

## BETREFT

Zaaknummer: 31129973  
Projectomschrijving: Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

BEZOEKADRES  
Marten Meesweg 25-G  
ROTTERDAM

## PROJECTNUMMER

C481-10 -0000

## BEHANDELD DOOR

AFDELING ADMINISTRATIE  
T 023 - 752 86 22  
E-MAIL  
VERKOOPFACTUREN.DVI@  
DURAVERMEER.NL

BETALINGSGEGEVENS  
ING NL70INGB0008035889  
KvK 76263851  
BTW NL860566687B01

BIC INGBNL2A  
G-REKENING

Omschrijving	Aantal	Eenh.	Prijs	Bedrag
Bestelnummer: 4500287593, positienummer 20	1,00	post	1.741.674,47	1.741.674,47
Bestelnummer: 4500296637, positienummer 10 (VTW-003)	1,00	post	19.444,08	19.444,08
Bestelnummer: 4500300306, positienummer 10 (VTW-004)	1,00	post	4.284,00	4.284,00
Bestelnummer: 4500298750, positienummer 10 (VTW-005)	1,00	post	37.376,02	37.376,02
Bestelnummer: 4500300416, positienummer 10 (VTW-009)	1,00	post	81.907,04	81.907,04
Bestelnummer: 4500300309, positienummer 10 (VTW-026)	1,00	post	610,28	610,28
Bestelnummer: 4500303711, positienummer 10 (VTW-036)	1,00	post	44.259,51	44.259,51
Bestelnummer: 4500303904, positienummer 10 (VTW-039)	1,00	post	12.735,70	12.735,70

Totaal excl. BTW	1.942.291,10
BTW 21%	407.881,13
<b>Totaalbedrag in €</b>	<b>2.350.172,23</b>

Betalingsconditie: netto binnen 30 dagen na factuurdatum.  
Bij betaling en op correspondentie debiteurcode en factuurnummer vermelden.

# Model Prestatieverklaring UAV-GC

(Versie: 24-7-2017)

Naam Opdrachtnemer: Combinatie STIPT V.O.F.

Zaaknummer: 31129973

Prijs, excl. BTW: € 37.764.542 EURO<sup>1</sup>


Aantal termijnen op basis van de  
bij de Overeenkomst behorende  
termijnstaat: 35 termijnen

## Verklaring

Opdrachtgever/diens vertegenwoordiger: Bram van Bemmelen

verklaart hierbij dat conform de Overeenkomst de Opdrachtnemer recht heeft op betaling van de 18<sup>e</sup> factureringstermijn, zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot €1.942.291 EURO<sup>2</sup> (zegge: één miljoen negenhonderdtweeënveertig duizend tweehonderdeenennegentig EURO)<sup>3</sup>

..... Bodegraven ..... (plaats), 30-11-2020 ..... (datum)

.....  ..... (handtekening)

De Opdrachtnemer dient het origineel van deze ondertekende prestatieverklaring bij zijn aan de Opdrachtgever te zenden (termijn)factuur te sluiten. Op de (termijn)factuur dient, naast de in de Overeenkomst verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

Op de factuur dienen de volgende bedragen (excl. BTW) met bijbehorende bestelnummers gefactureerd te worden:


Bestelnummer: 4500287593, positienummer 20	Bedrag: € 1.742.760	
Bestelnummer: 4500297396, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-002)
Bestelnummer: 4500296637, positienummer 10	Bedrag: € 19.444	(VTW-003)
Bestelnummer: 4500300306, positienummer 10	Bedrag: € 4.284	(VTW-004)
Bestelnummer: 4500298750, positienummer 10	Bedrag: € 37.376	(VTW-005)
Bestelnummer: 4500300416, positienummer 10	Bedrag: € 81.907	(VTW-009)
Bestelnummer: 4500298226, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-013)
Bestelnummer: 4500298376, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-015)
Bestelnummer: 4500300311, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-020)
Bestelnummer: 4500300308, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-024)
Bestelnummer: 4500300309, positienummer 10	Bedrag: € 610	(VTW-026)
Bestelnummer: <del>nvt</del> , positienummer <del>10</del>	Bedrag: € -1.085	(VTW-028) 4500287593, pos 20
Bestelnummer: 4500303083, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-030)
Bestelnummer: 4500303081, positienummer 10	Bedrag: € 0,00	(VTW-035)
Bestelnummer: 4500303711, positienummer 10	Bedrag: € 44.260	(VTW-036)
Bestelnummer: 4500303916, positienummer 10	Bedrag: € 12.736	(VTW-039)

<sup>1</sup> Bedrag in cijfers.


<sup>2</sup> Bedrag van de termijn in cijfers.

<sup>3</sup> Bedrag van de termijn in letters

### Termijnstaat - Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

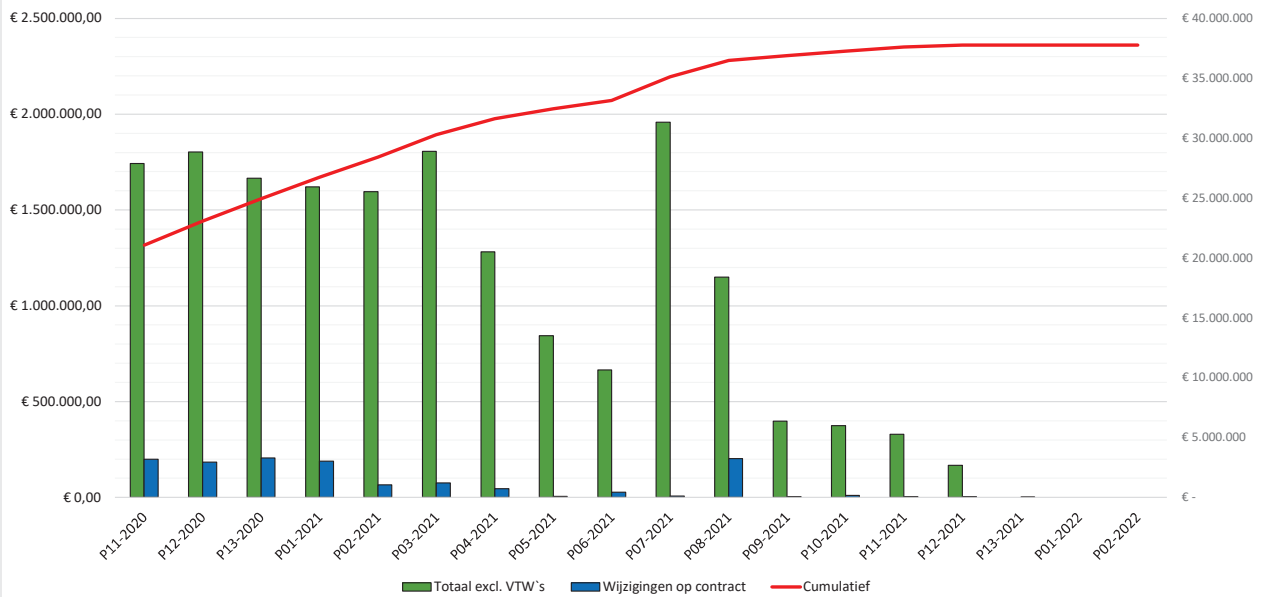

### Termijn 18 - Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

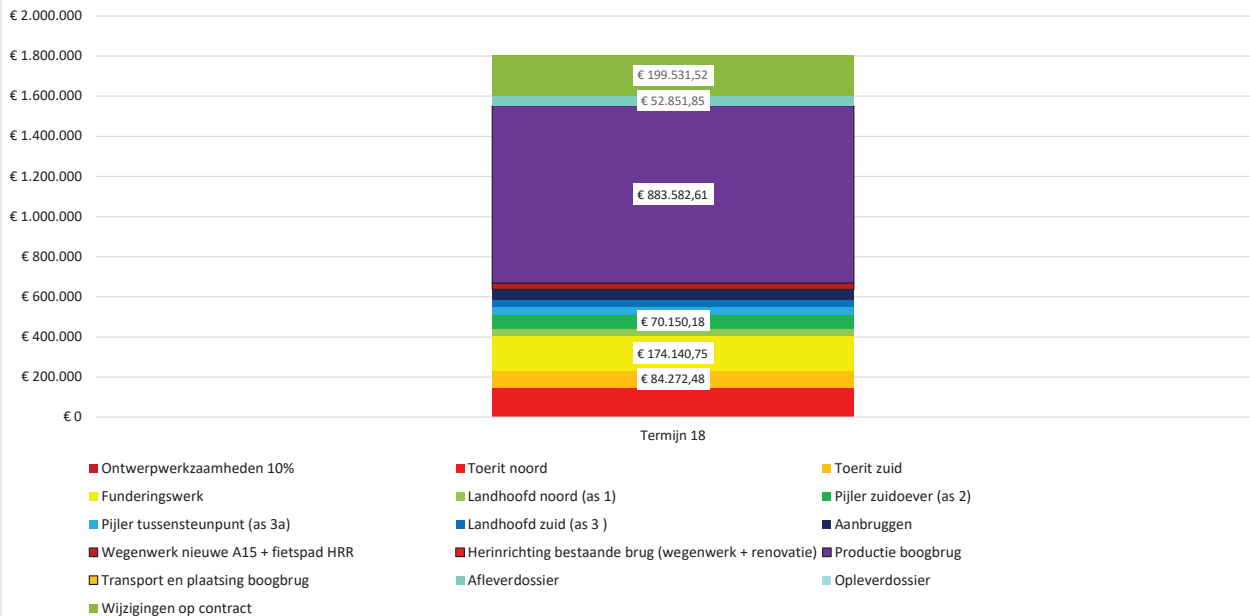

Betaalpost	Omschrijving	Kostprijs			Aanheemsom			Planning			Controle		P11-2020
								start	einde	Werkdagen	Dagprijs lineair		Termijn 18
1	Ontwerpwerkzaamheden 10%	10%	€	2.588.665,32	€	3.576.500,00	€	08-07-2019	24-07-2020	383	€	3.576.500	€
2	Toerit noord		€	761.955,00	€	1.052.717,03	€	12-10-2020	28-04-2021	199	€	1.052.717	€ 148.121
3	Toerit zuid		€	1.285.279,00	€	1.775.741,47	€	06-04-2020	16-11-2021	590	€	1.775.741	€ 84.272
4	Funderingswerk		€	1.089.370,00	€	1.505.073,59	€	17-04-2020	14-12-2020	242	€	1.505.074	€ 174.141
5	Landhoofd noord (as 1)		€	223.914,00	€	309.359,58	€	14-09-2020	30-04-2021	229	€	309.360	€ 37.826
6	Pijler zuidoever (as 2)		€	551.267,00	€	761.630,49	€	30-03-2020	27-01-2021	304	€	761.630	€ 70.150
7	Pijler tussensteunpunt (as 3a)		€	124.205,00	€	171.601,63	€	27-07-2020	17-11-2020	114	€	171.602	€ 34.621
8	Landhoofd zuid (as 3)		€	168.980,00	€	233.462,77	€	27-07-2020	09-11-2020	106	€	233.463	€ 33.037
9	Aanbruggen		€	974.734,00	€	1.346.692,49	€	16-11-2020	06-05-2021	172	€	1.346.692	€ 54.807
10	Wegenwerk nieuwe A15 + fietspad HRR		€	280.406,00	€	387.408,93	€	21-09-2020	22-08-2021	336	€	387.409	€ 32.284
11	Herinrichting bestaande brug (wegenwerk + renovatie)		€	1.633.568,00	€	2.256.937,55	€	12-07-2021	11-08-2021	31	€	72.804,44	€ -
12	Productie boogbrug		€	12.142.834,70	€	16.776.540,42	€	18-11-2019	15-04-2021	515	€	32.575,81	€ 883.583
13	Transport en plaatsing boogbrug		€	1.181.712,71	€	1.632.654,28	€	01-04-2021	24-06-2021	85	€	1.632.654	€ -
16	Afbouw		€	1.523.545,00	€	2.104.929,77	€	05-10-2020	08-12-2021	430	€	2.104.930	€ 137.065
Subtotaal				€ 24.530.435,73	€	33.891.250,00	€				€ 33.891.250	€ 1.689.908	
14	Afleverdossier	3%	€	1.070.250,00	€	1.070.250,00	€	25-03-2020	12-10-2021	567	€	1.070.250	€ 52.852
15	Opleverdossier	2%	€	713.500,00	€	713.500,00	€	02-07-2021	10-12-2021	162	€	713.500	€ -
Totaal excl. VTW's				€ 26.314.185,73	€	35.675.000,00	€				€ 35.675.000	€ 1.742.760	
Cumulatief				€	€	35.675.000,00	€				€ 35.675.000	€ 20.016.473	
VTW	Wijzigingen op contract	Oprichtings/bestel nr	€	1.566.373	€	2.089.542	€	1	€	616.907,43	€	2.089.542	€ 199.532
2	Afwerking gewapende Grond	4500297396 pos. 10	€	190.220	€	253.754	€	10-12-2020	15-02-2021	68	€	253.754	€ -
3	Leuningswerk hoger uitvoeren i.v.m. veiligheid	4500296637	€	98.907	€	131.942	€	14-10-2020	21-04-2021	190	€	131.942	€ 19.444
4	Onderhoudswerk tijdens uitvoering	4500300306	€	61.131	€	81.549	€	10-07-2020	24-12-2021	533	€	153.000	€ 4.284
5	Gewapende grond in CC3 uitvoeren ipv CC2	4500298750 pos.10	€	225.145	€	300.343	€	11-09-2020	23-04-2021	225	€	1.334,86	€ 37.376
6	Extra Bouwborden	SFB-000518	€	3.010	€	4.015	€	21-01-2020	21-01-2020	1	€	4.015,00	€ -
8	Tegenvallende geotechnische gesteldheid	4500303428 zaaknr: 31	€	135.948	€	181.355	€	22-10-2020	22-10-2020	1	€	181.355,00	€ -
9	Dikere dekplaat boogbrug	4500300416	€	383.747	€	511.919	€	10-07-2020	31-12-2020	175	€	2.925,25	€ 81.907
10	Latere afvoer stamhout	SFB-000541	€	2.890	€	3.855	€	10-05-2020	10-05-2020	1	€	3.855,00	€ -
12	Gewijzigde rekenmethode aanvaarbeveiliging	SFB-000542	€	18.011	€	24.027	€	21-01-2020	21-01-2020	1	€	24.027,00	€ -
13	Blauw toelicht OV masten	4500298226 pos.10.	€	6.367	€	8.493	€	21-06-2021	22-06-2021	2	€	8.493	€ -
15	Doortrekken Geluidsscherm	4500298376 pos.10	€	23.115	€	30.835	€	11-01-2021	05-02-2021	26	€	1.185,96	€ -
19	Verplaatsen kast nabij VDC		€	-	€	-	€	1	€	-	€	-	€ -
20	Compendium beginpunt geleiderailconstructies	4500300311	€	5.712	€	7.620	€	25-06-2021	11-07-2021	17	€	448,24	€ -
21	Impact toetsing GPO op ontwerp/uitvoering Staal	4500303430 zaaknr: 31	€	168.678	€	225.016	€	22-10-2020	22-10-2020	1	€	225.016,00	€ -
22	Impact werkzaamheden ProRail op monitoring	4500300308	€	10.305	€	13.747	€	04-08-2020	22-08-2020	19	€	723,53	€ -
23	V/A-2 aanvullende vragen omtrent geleiderail	4500298227 pos. 10	€	2.629	€	3.507	€	10-07-2020	11-07-2020	2	€	1.753,50	€ -
24	Verschil Tender en werkelijkse situatie t.b.v. HRL	4500303155 pos. 10	€	149.130	€	198.940	€	21-08-2021	22-08-2021	2	€	99.470,00	€ -
26	Verlichting Krabbeweg	4500300309	€	5.277	€	7.040	€	10-07-2020	28-05-2021	323	€	7.040	€ 610
27	Onbekende kabels & leidingen noord- en zuidzijde		€	-	€	-	€	1	€	-	€	-	€ -
28	Verrekening legeskosten	nvt	€	-813	€	-1.085	€	10-11-2020	10-11-2020	1	€	-1.085,10	€ -1.085
30	Glad afwerken spuitbeton	4500303083 pos. 10	€	23.617	€	31.505	€	30-03-2021	29-04-2021	31	€	1.016,29	€ 31.505
31	Brandblusleiding als cat. 3 leiding behandelen	nvt	€	-8.716	€	-11.627	€	10-10-2020	10-10-2020	1	€	-11.627,14	€ -
32	Corona impact		€	-	€	-	€	1	€	-	€	-	€ -
33	Obstakels ondergrond zuidzijde		€	-	€	-	€	1	€	-	€	-	€ -
34	Holte ondergrond landhoofd Noord		€	-	€	-	€	1	€	-	€	-	€ -
35	RAL kleur OV-masten	4500303081 pos. 10	€	7.999	€	10.670	€	16-06-2021	22-06-2021	7	€	1.524,29	€ -
36	Fase 1.1 versterking dekplaat basculedeed bestaande brug	4500303711 pos.10 zaai	€	33.178	€	44.260	€	10-11-2020	10-11-2020	1	€	44.260,51	€ 44.260
38	BGT	4500303916 zaaknr: 31	€	4.740	€	6.323	€	01-10-2021	01-10-2021	1	€	6.323,16	€ -
39	Asbest en loodhoudende verf Bruggwachtershuisje	4500303904 zaaknr: 31	€	9.547	€	12.736	€	10-11-2020	10-11-2020	1	€	12.735,70	€ 12.736
40	Herstellen stroefheid HRL 26.6	4500302930 pos. 10	€	6.600	€	8.804	€	19-10-2020	19-10-2020	1	€	8.804,00	€ -
Totaal incl. VTW's				€ 27.880.559	€	37.764.542	€				€ 37.764.542	€ 1.942.291	
Cumulatief				€	€	37.764.542	€				€ 37.764.542	€ 21.071.911	



[illegible]

€	37.764.542	Productgroep	Percentage	Totaal	P07-2019	P08-2019	P09-2019	P10-2019	P11-2019	P12-2019	P13-2019	P01-2020	P02-2020	P03-2020	P04-2020	
					Termijn 1	Termijn 2	Termijn 3	Termijn 4	Termijn 5	Termijn 6	Termijn 7	Termijn 8	Termijn 9	Termijn 10	Termijn 11	
					€ 361.467	€ 361.467	€ 361.467	€ 361.467	€ 487.906	€ 1.167.221	€ 1.195.262	€ 1.237.057	€ 1.505.443	€ 1.597.927	€ 1.237.057	€ 1.505.443
					€ 361.467	€ 722.935	€ 1.084.402	€ 1.445.869	€ 1.933.775	€ 3.100.996	€ 4.268.217	€ 5.463.479	€ 7.061.406	€ 8.298.463	€ 9.803.906	
					€ 126.514	€ 126.514	€ 126.514	€ 126.514	€ 170.767	€ 408.527	€ 418.342	€ 559.274	€ 432.970	€ 526.905		
					€ 36.147	€ 36.147	€ 36.147	€ 36.147	€ 48.791	€ 116.722	€ 119.526	€ 159.793	€ 123.706	€ 150.544		
					juli-19	augustus-19	september-19	oktober-19	november-19	december-19	januari-20	februari-20	maart-20	april-20	mei-20	
					191,8	191,8	191,8	191,8	191,8	191,8	193,1	193,1	193,1	193,1	193,1	
					251,8	249,4	256,8	256,6	257	260,9	264,5	252,8	236,7	229,1	223,7	
					€ 2.025	€ 1.691	€ 2.719	€ 2.692	€ 3.708	€ 10.621	€ 15.075	€ 10.061	€ 3.559	€ -859	€ -4.171	
					Indexatieregeling excl staal											

